สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

การติดตามความก้าวหน้า สัปดาห์ที่ 20 / 2566

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ตามแผนงานก่อสร้าง	90.90 %
ผลงานก่อสร้างสะสม	63.13 %
ช้ากว่าแผนงาน	25.91 %
ผลงานประจำสัปดาห์	0.00 %

ดำเนินการมาแล้ว	1,487 วัน
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการ	131 วัน

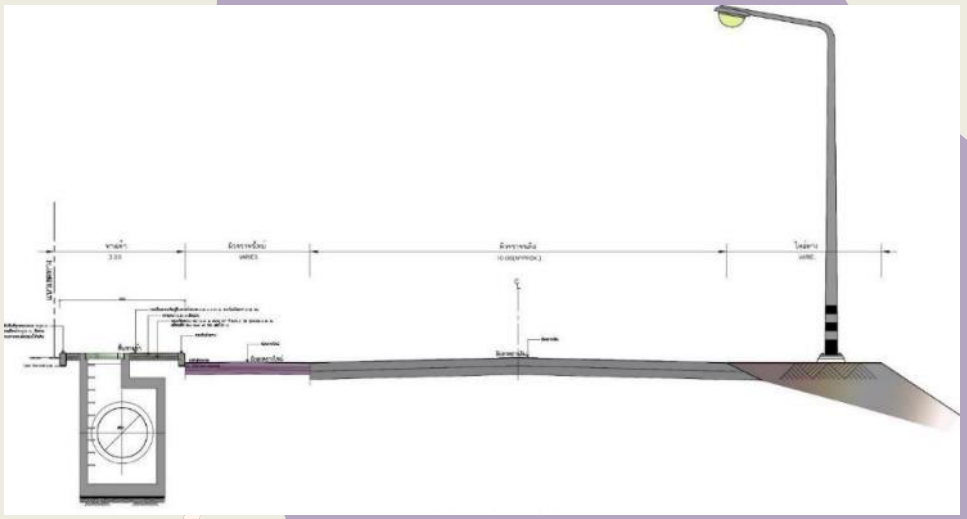

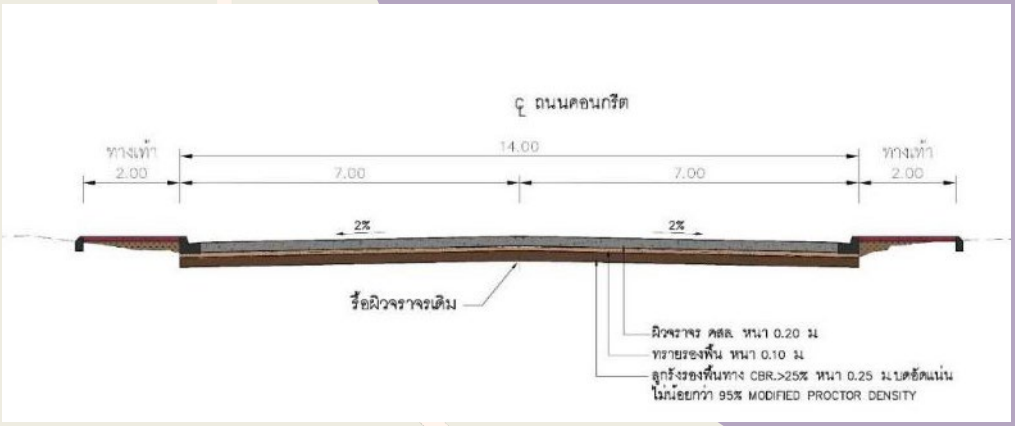

แผน – ผล งานก่อสร้างรายสัปดาห์

สัปดาห์ที่	ช่วงวันที่	แผนงานสะสม(%)	แผนงานรายสัปดาห์	ผลงานสะสมจริง (%)	ผลงานรายสัปดาห์	ผลต่าง (%)
		1	2	3	4	2-4
1 / 2566	1 ม.ค.66 - 7 ม.ค. 66	62.42%	1.10%	60.22%	0.00%	-2.20%
2 / 2566	8 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66	63.52%	1.10%	60.22%	0.00%	-3.30%
3 / 2566	16 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66	64.62%	1.10%	60.25%	0.03%	-4.37%
4 / 2566	24 มค. 66 - 31 ม.ค. 66	66.82%	1.10%	60.25%	0.00%	-6.57%
5 / 2566	1 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66	68.41%	1.59%	60.25%	0.00%	-8.16%
6 / 2566	8 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66	70.00%	1.59%	60.25%	0.00%	-9.75%
7 / 2566	16 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66	71.59%	1.59%	60.43%	0.18%	-11.16%
8 / 2566	24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66	73.18%	1.59%	60.59%	0.16%	-12.59%
9 / 2566	1 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66	75.38%	2.20%	61.29%	0.70%	-14.09%
10 / 2566	8 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66	77.58%	2.20%	61.84%	0.55%	-15.74%
11 / 2566	16 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66	79.78%	2.20%	62.08%	0.24%	-17.70%
12 / 2566	24 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66	81.98%	2.20%	62.39%	0.31%	-19.59%
13/2566	1 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66	83.28%	1.30%	62.83%	0.44%	-20.45%
14/2566	8 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66	84.58%	1.30%	62.98%	0.15%	-21.60%
15/2566	16 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66	85.88%	1.30%	62.98%	0.00%	-22.90%
16/2566	24 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66	87.18%	1.30%	63.04%	0.06%	-24.14%
17/2566	1 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66	88.11%	0.93%	63.04%	0.00%	-25.07%
18/2566	8 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66	89.04%	0.93%	63.13%	0.09%	-25.91%
19/2566	16 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66	89.97%	0.93%	63.13%	0.00%	-26.84%
20/2566	24 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66	90.90%	0.93%	63.13%	0.00%	-27.77%

ความก้าวหน้าโครงการ สรุปผลงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

1.ช่วง DR-01 บริเวณ ถนนกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแก่งดอนกลาง

1.1 DR01(1) Ø 1.20 ม. กม. 0+000.0 ถึง กม. 1+072.0 แผนงาน 100% ผลงานทำได้ 96.46%

1.2 DR01(2) Ø 1.50 ม. กม. 1+072.0 ถึง กม. 1+828.5 แผนงาน 100% ผลงานทำได้ 98.20%

1.3 DR01(3) ท่อเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50 ม. กม.1+828.5 -กม. 4+086.2 แผนงาน 70.50% ผลงานทำได้ 72.10%

2. DR-03 ถนนชัยสุนทรช่วงวงเวียนโปงลางถึงซอยฉายจรุง ท่อ ค.ส.ล.Ø 1.20 ม. ยาว 773.7 ม. แผนงาน 0.00% ผลงานทำได้ 0.00%

3. DR-05 ตรงข้ามห้างโลตัสถึงสะพานข้ามลำน้ำปาวเก่า ช่วง กม. 0+000.0 ถึงกม. 1+069.5 ผลงานทำได้ 0.00%

3.1 DR05(1) Ø 1.50 ม. กม. 0+000 ถึง กม. 0+225 แผนงาน 0.00% ผลงานทำได้ 0.00%

3.2 DR05(1) ท่อเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50 ม. กม.0+225 ถึง กม. 1+069.5 แผนงาน 0.00% ผลงานทำได้ 0.00%

4. ช่วง DR-02 บริเวณ ถนนถีนานนท์จากสี่แยกป่าไม้ถึงการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

5. ช่วง DR-04 บริเวณ ถนนช่วงโรงเรียนอนุกูลนารีถึงจุดบรรจบถนนถีนานนท์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

6.ช่วง DR-08 บริเวณ ถนนวิโรจน์รัตน์ถึงทอลอดหน้าการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

7.งานก่อสร้างถนน/ปรับปรุง ถนนพร้อมพรรณอุทิศ (RD01) บริเวณ ถนนพร้อมพรรณอุทิศ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

ความก้าวหน้างวดงานคงค้าง/เร่งด่วน สรุปผลงานเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

1.งวดงานคงค้าง (ใกล้เสร็จ) จำนวน 11 งวดงาน

1.งวดที่ 4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø1.20 ม. DR01(1) sta.0+000-sta.0+230 พร้อมบ่อพักไม่รวมฝา

ผลงานปัจจุบัน วางท่อแล้ว 270 ม. ผลงานที่ขาด / แก้ไข-เพิ่มเติม 1.1 ยาแนวภายในท่อ

2. งวดที่ 12 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ DR01(2) โดยงานดันที่ลอดขนาด Ø-1.50 ม.แล้วเสร็จ

ผลงานปัจจุบัน ดันท่อแล้ว 36 ม.จากทั้งหมด 39 ม. คิดเป็น 92.32%

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 2.1 เหลืองานดันท่ออีก 1 ท่อน ระยะ 3 ม.

3. งวดที่ 13 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ DR01(2) พร้อมฝาบ่อพักและซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล.ได้ 1,500 ตร.ม.

ผลงานปัจจุบัน งานซ่อมผิวจราจร ซ่อมผิวจราจรได้ 1,500 ตร.ม. ติดตั้งฝาบ่อพักได้ 16 ฝา จากทั้งหมด 18 ฝา คิดเป็น 99.50%

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 3.1 ติดตั้งฝาบ่อพัก 2 ฝา 3.2 ติดตั้งบันไดเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ลงบ่อพัก 18 บ่อ 3.3 ซ่อมคืนคันหินและทางเท้าเดิมที่ชำรุดเสียหาย ระยะ 500 ม.

4. งวดที่ 32 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ DR02 พร้อมฝาบ่อพักและซ่อมผิวจราจรได้ 1,000 ตร.ม.

ผลงานปัจจุบัน งานซ่อมผิวจราจร พร้อมบ่อพักและซ่อมผิวจราจรได้ 1,000 ตร.ม.sta.0+000-sta.0+510

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 4.1 รอการแก้ไขแบบ - สัญญา เนื่องจาก สภาพถนนจริงเป็นผิวแอสฟัสต์ ในใบแสดงปริมาณงานเป็นถนนคอนกรีต 4.2 งานตีเส้นจราจร

5. งวดที่ 33 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø1.20 ม. DR02 พร้อมฝาบ่อพักและซ่อมผิวจราจรส่วนที่เหลือทั้งหมด

ผลงานปัจจุบันงาน ซ่อมผิวจราจร พร้อมบ่อพักและซ่อมผิวจราจรทั้งหมด DR02 sta.0+510-sta.0+606

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 5.1 รอการแก้ไขแบบ - สัญญา เนื่องจาก สภาพถนนจริงเป็นผิวแอสฟัสต์ ในใบแสดงปริมาณงานเป็นถนนคอนกรีต 5.2 งานตีเส้นจราจร

6. ส่วนที่ 4 อาคารชลศาสตร์ งวดที่ 3 ก่อสร้างอาคารชลศสตร์ โดยทำการก่อสร้างบ่อดักขยะ (DR01-3)

ผลงานปัจจุบันงาน ก่อสร้างบ่อดักขยะคอนกรีตแล้วเสร็จ

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 6.1 ตะแกรงดักขยะชุบกัลป์วาไนส์ 6.2 ฝาตะแกรงบ่อดักขยะเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ 6.3 บันไดชุบกัลวาไนส์ ลงบ่อพัก

ความก้าวหน้างวดงานคงค้าง/เร่งด่วน สรุปผลงานเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

7. ส่วนที่ 4 อาคารชลศาสตร์ งวดที่ 4 ก่อสร้างอาคารชลศสตร์ โดยทำการก่อสร้างบ่อดักขยะ (DR01-4)

ผลงานปัจจุบันงาน ก่อสร้างบ่อดักขยะคอนกรีตแล้วเสร็จ ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 7.1 ตะแกรงดักขยะชุบกัลป์วาไนส์ 7.2 ฝาตะแกรงบ่อดักขยะเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ 7.3 บันไดชุบกัลวาไนส์ ลงบ่อพัก

8. ส่วนที่ 4 อาคารชลศาสตร์ งวดที่ 5 ก่อสร้างอาคารชลศสตร์ โดยทำการก่อสร้างบ่อดักขยะ (DR01-5)

ผลงานปัจจุบันงาน ก่อสร้างบ่อดักขยะคอนกรีตแล้วเสร็จ

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 8.1 ตะแกรงดักขยะชุบกัลป์วาไนส์ 8.2 ฝาตะแกรงบ่อดักขยะเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ 8.3 บันไดชุบกัลวาไนส์ ลงบ่อพัก

9. ส่วนที่ 4 อาคารชลศาสตร์ งวดที่ 10 ก่อสร้างอาคารชลศสตร์ โดยทำการก่อสร้างบ่อดักขยะ (DR01-10)

ผลงานปัจจุบันงาน ก่อสร้างบ่อดักขยะคอนกรีตแล้วเสร็จ

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 9.1 ตะแกรงดักขยะชุบกัลป์วาไนส์ 9.2 ฝาตะแกรงบ่อดักขยะเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ 9.3 บันไดชุบกัลวาไนส์ ลงบ่อพัก

10.ส่วนที่ 4 อาคารชลศาสตร์ งวดที่ 11 ก่อสร้างอาคารชลศสตร์ โดยทำการก่อสร้างบ่อ CSO01

ผลงานปัจจุบันงาน ก่อสร้างบ่อดักขยะคอนกรีตแล้วเสร็จ

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 10.1 ตะแกรงดักขยะชุบกัลป์วาไนส์ 10.2 ฝาตะแกรงบ่อดักขยะเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ 10.3 บันได แสตนเลส SU304 ลงบ่อพัก 10.4 ท่อระบายน้ำเสีย HDPE Ø10” PN10 เชื่อมระบบรับน้ำเสียเทศบาล

11.ส่วนที่ 4 อาคารชลศาสตร์ งวดที่ 12 ก่อสร้างอาคารชลศสตร์ โดยทำการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ (MG-MP01) พร้อมบ่อกันย้อนและรางน้ำรูปตัว U พร้อมบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ผลงานปัจจุบันงาน ก่อสร้างบ่อดักขยะคอนกรีตและรางตัว U แล้วเสร็จ

ผลงานที่ขาด/แก้ไข-เพิ่มเติม 11.1 ตะแกรงดักขยะชุบกัลป์วาไนส์ 11.2 ฝาตะแกรงบ่อดักขยะเหล็กชุบกัลป์วาไนส์ 11.3 บันไดชุบกัลป์วาไนส์ ลงบ่อพัก 11.4 กล่องแกเบียนเรียงหิน 11.5 ประตูน้ำกันย้อน

*** ข้อเท็จจริง ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จครบตามงวดงาน โดยไม่มีความกว้าหน้างานต่อเนื่องกันเป็นเวลา 349 วัน
(สัปดาห์นี้ 23 - 30 พ.ค. 66 ไม่มีการทำงานในส่วนนี้)

ความก้าวหน้างวดงานคงค้าง/เร่งด่วน สรุปผลงานเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

2. งานก่อสร้างท่อระบายน้ำจุดเชื่อมต่อ ระหว่างปลายท่อช่วงโครงการ DR04 กับ ช่วงโครงการ DR05 เพื่อให้การระบายน้ำของ DR04 ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำท่วมถนนพร้อมพรรณอุทิศ (RD01) เป้าหมายให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเข้าฤดูฝน

*** ข้อเท็จจริง ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในส่วนนี้ (สัปดาห์นี้ 23 - 30 พ.ค. 66 ไม่มีการทำงานในส่วนนี้)

3. งานก่อสร้างท่อระบายน้ำช่วงโครงการ DR01(3) บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตร ซึ่งมีผลกระทบชุมชน และ ผลกระทบการสัญจรของประชาชน

*** ข้อเท็จจริง ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าเจรจาในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบ และ เร่งการซ่อมคืนผิวจราจรควบคู่ไปกับงานวางท่อ (สัปดาห์นี้ 23 - 30 พ.ค. 66 ไม่มีการทำงานในส่วนนี้)

4. กำหนดเวลาแล้วเสร็จของ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำช่วงโครงการ DR01(1),DR01(2),DR01(3)

*** ข้อเท็จจริง ปัจจุบันผู้รับจ้าง มีแรงงานทำงานเฉพาะช่วง DR01(3) เท่านั้น ส่วน DR01(1),DR01(2) ไม่มีการทำงานเนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอและขาดการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกล และปัจจัยสำหรับดำเนินงานก่อสร้างอื่น (สัปดาห์นี้ 23 - 30 พ.ค. 66 ไม่มีการทำงานในส่วนงานวางท่อ)

5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จของ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำช่วงโครงการ DR05(1),DR05(2)

*** ข้อเท็จจริง ปัจจุบันผู้รับจ้าง มีแรงงานทำงานเฉพาะช่วง DR01(3) เท่านั้น ส่วน DR05(1),DR05(2) ไม่มีการทำงานเนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอและขาดการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรส่วนควบคุมงาน บุคลาการในการประสานงาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกล และปัจจัยสำหรับดำเนินงานก่อสร้างอื่น (สัปดาห์นี้ 23 - 30 พ.ค. 66 ไม่มีการทำงานในส่วนนี้)

DR01(1) กม. 0+000.0 ถึง กม. 1+072.0 ถนนกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแก่งดอนกลาง

แผนงานก่อสร้าง 100% **ผลงานก่อสร้าง 96.46%** **เร็ว/ช้ากว่าแผน - 3.44%**

<u>ผลงานประจำสัปดาห์</u> - สัปดาห์นี้ไม่มีการทำงาน โดยจะเร่งเข้าดำเนินการ ก่อสร้างในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

<u>แผนงานสัปดาห์ถัดไป</u> - ยาแนวภายในท่อ , ปรับดินลูกรังเรียบและบดอัด ตามแนววางท่อ ซ่อมคืนคันหินและทางเท้า ของถนนโยธาธิการและผังเมือง 2

ภาพเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566

ภาพเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

DR01(2) Ø 1.50 ม. กม. 1+072.0 - กม. 1+828.5 ถนนกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแก่งดอนกลาง

แผนงานก่อสร้าง 100% **ผลงานก่อสร้าง 91.20%** **เร็ว/ช้ากว่าแผน - 8.80%**

<u>ผลงานประจำสัปดาห์</u> - สัปดาห์นี้ไม่มีการทำงาน โดยจะเร่งเข้าดำเนินการ ก่อสร้างในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

<u>แผนงานสัปดาห์ถัดไป</u> - ทำงานซ่อมคืนคันหินและทางเท้าเดิมถนนโยธาธิการและผังเมือง 2 ระยะ 500 ม.

ภาพเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566

ภาพเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

DR01(3) ท่อเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50 ม. กม.1+828.5 -กม. 4+086.2
ถนนกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแก่งดอนกลาง

แผนงานก่อสร้าง 70.50% **ผลงานก่อสร้าง 72.10%** **เร็ว/ช้ากว่าแผน + 1.60%**

<u>ผลงานประจำสัปดาห์</u> - สัปดาห์นี้ 23 - 30 พ.ค. 66 ไม่มีการทำงาน

<u>แผนงานสัปดาห์ถัดไป</u> -ทำงานวางท่อเหลี่ยม 1.50x1.50 ม. ระยะ 20 ม. ก.ม. 2+273 – ก.ม. 2+253 และทำงานงานซ่อมคืนผิวจราจร

ภาพเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566

ภาพเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

DR-03 ถนนชัยสุนทรช่วงวงเวียนโปงลางถึงซอยฉายจรุง ท่อ ค.ส.ล.Ø 1.20 ม. ยาว 773.7 ม.

แผนงานก่อสร้าง 0.00% ผลงานก่อสร้าง 0.00% เร็ว/ช้ากว่าแผน 0.00 %

<u>ผลงานประจำสัปดาห์</u> - ไม่มีการทำงานเนื่องจาก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอให้เริ่มทำงานได้หลังจากทำงานช่วง DR01(1) แล้วเสร็จ เนื่องจากต้องการลดผลกระทบชุมชน มีแผนเริ่มดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2566

<u>แผนงานสัปดาห์ถัดไป</u> - ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ภาพเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566

ภาพเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

DR05(1) Ø 1.50 ม. กม. 0+000 ถึง กม. 0+225 ตรงข้ามห้างโลตัสถึงสะพานข้ามลำน้ำปาวเก่า

แผนงานก่อสร้าง 0.00% ผลงานก่อสร้าง 0.00% เร็ว/ช้ากว่าแผน 0.00 %

<u>ผลงานประจำสัปดาห์</u> - ไม่มีการทำงาน งานวางท่อมีแผนเริ่มดำเนินการ 1 มิถุนายน 2566

<u>แผนงานสัปดาห์ถัดไป</u> - งานจัดการจราจร งานเครียริ่งแนวก่อสร้าง

ภาพเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566

ภาพเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

DR05(2) ท่อเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50 ม. กม.0+225 ถึง กม. 1+069.5 ตรงข้ามห้างโลตัสถึงสะพานข้ามลำน้ำปาวเก่า

แผนงานก่อสร้าง 0.00% ผลงานก่อสร้าง 0.00% เร็ว/ช้ากว่าแผน 0.00 %

<u>ผลงานประจำสัปดาห์</u> - ไม่มีการทำงาน งานวางท่อมีแผนเริ่มดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2566

<u>แผนงานสัปดาห์ถัดไป</u> - งานจัดการจราจร งานเครียริ่งแนวก่อสร้าง

ภาพเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566

ภาพเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง : พื้นที่ชุมชุนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะการใช้สอย :เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนเมือง กาฬสินธุ์ เพิ่มมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อ สาธารณะภัยและป้องกันความ เสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น อาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ

ผู้ออกแบบ : บริษัท แมทโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ควบคุมงาน : บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ 102/2562

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562

เริ่มดำเนินงาน 12 มิถุนายน 2562

ถึง 18 กันยายน 2564

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์

เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

เริ่มงานวันที่ : 19 เมษายน 2562

กำหนดแล้วเสร็จ : 26 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาดำเนินการ : 800 วัน

มูลค่างาน : 148,200,000.00 (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)
